


▶ 별첨자료

측정일자 : 2019.07.26

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
#1 (다목적실 1층복도)	100	12.194	0.0030	기준치미만
#2 (다목적실 1층복도)	100	12.149	0.0040	기준치미만
#3 (다목적실1층 미술실)	100	12.158	0.0032	기준치미만
#4 (다목적실1층 미술실)	100	12.115	0.0032	기준치미만
#5 (다목적실1층 미술실)	100	12.166	0.0038	기준치미만
#6 (다목적실1층 미술실)	100	12.113	0.0045	기준치미만
#7 (도서관)	100	12.214	0.0042	기준치미만
#8 (도서관)	100	12.124	0.0036	기준치미만
#9 (도서관)	100	12.157	0.0028	기준치미만
#10 (도서관)	100	12.197	0.0030	기준치미만

한일중학교 석면천정재 철거공사 농도측정 위치도

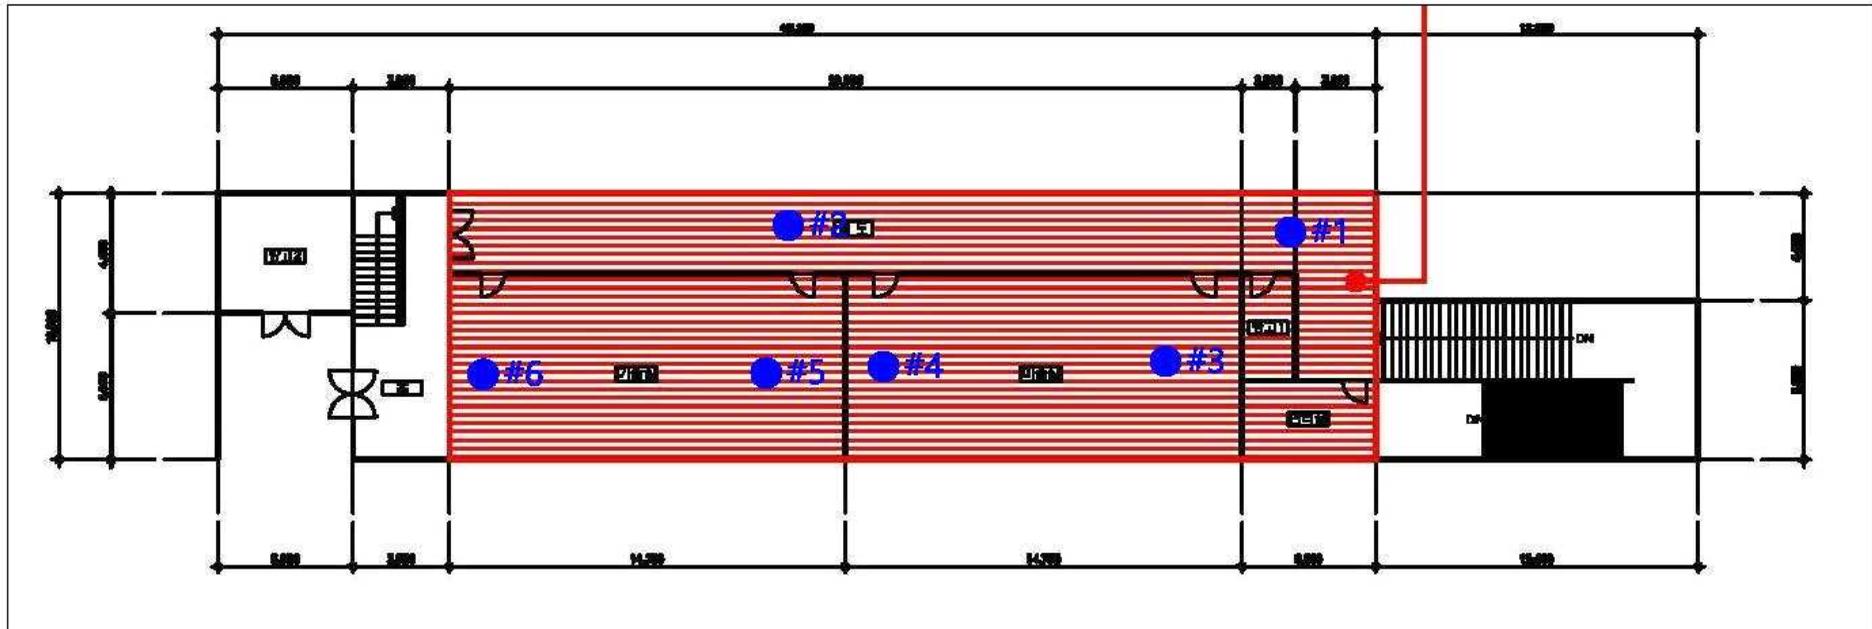

건축물소재지

한일중학교
다목적실1층

석면자재

천장재(텍스)

석면면적

345.00㎡


측정일자

2019. 07. 26

측정 및 분석기관

(주)ISAA엔지니어링

한일중학교 석면천정재 철거공사 농도측정 위치도

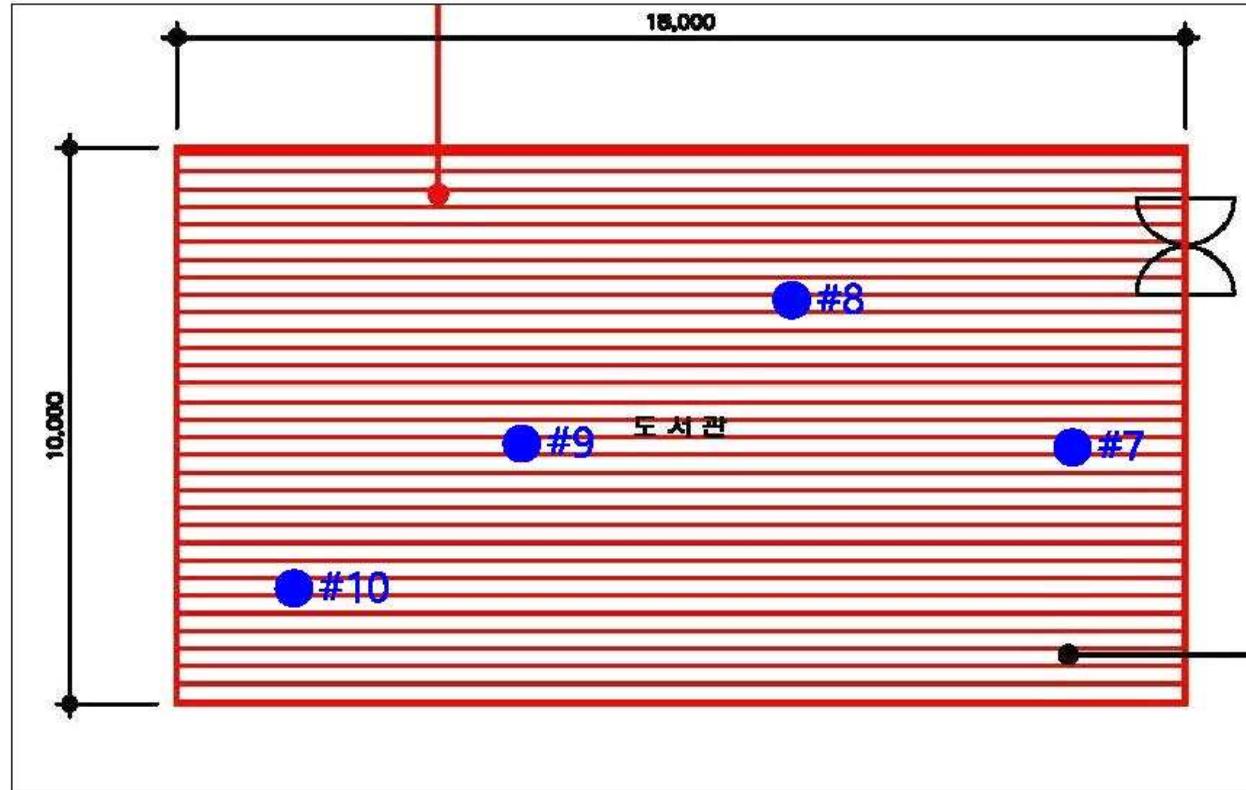

건축물소재지

한일중학교
도서관

석면자재

천장재(텍스)

석면면적

180 m²

측정일자

2019. 07. 26

측정 및 분석기관

(주)ISAA엔지니어링

▶ 첨부서류

측정일시	2019년 07월 26일 (1일간)			
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	HI0726-01	부지경계선1	0.0001	기준 미만
	HI0726-02	부지경계선2	0.0002	기준 미만
	HI0726-03	부지경계선3	0.0004	기준 미만
	HI0726-04	부지경계선4	0.0003	기준 미만
	HI0726-05	위생설비입구1	0.0010	기준 미만
	HI0726-06	음압기 배출구1	0.0016	기준 미만
	HI0726-07	음압기 배출구2	0.0014	기준 미만
	HI0726-08	폐기물 반출구	0.0004	기준 미만

